



INSTITUTO SONorense DE
**INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA**
GOBIERNO
de SONORA




SISTEMAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN ESCUELAS



INSTITUTO SONORENSE DE
**INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA**

GOBIERNO
DE SONORA

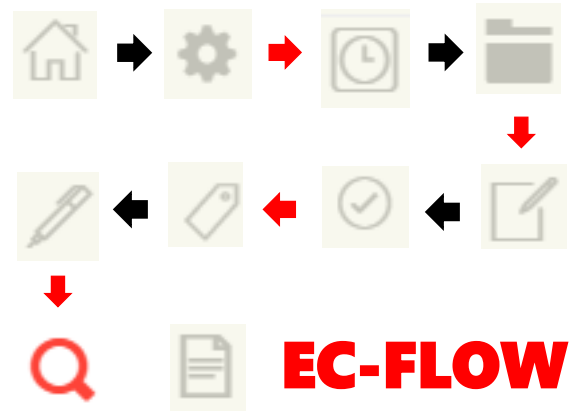


PLATAFORMA EC-FLOW


Control del Flujo de Trabajo de las Obras en Escuelas de

ANTECEDENTES

- **La Plataforma EC-FLOW (Control del Flujo de los trabajos en Escuelas de Sonora)**, es una herramienta web que permite controlar el proceso relacionado con la Planeación, Dictaminación, Validación, Proyecto, Presupuestación, Contratación y Supervisión de las Obras.

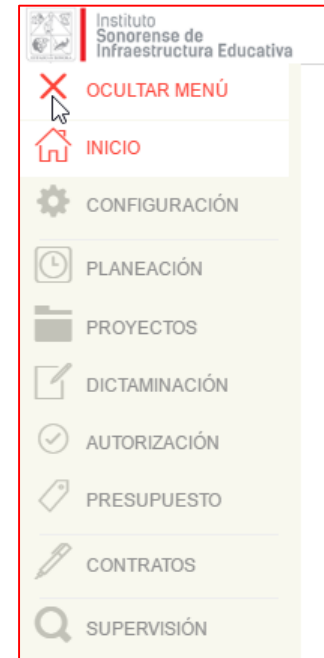

- Organiza la cadena de responsabilidad para el registro y consulta de información.
- Incorpora tableros de control para facilitar el seguimiento al cumplimiento de cada una de las etapas del proceso que incluyen entre las principales características de sus módulos:

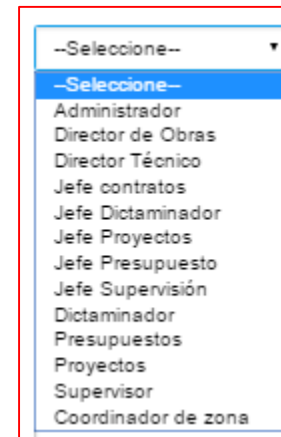

PLANEACION

El Módulo de Planeación permite registrar o importar las obras que ejecuta el ISIE antes de ser contratadas, presenta una lista de obras con la posibilidad de ser filtrada por ejercicio, programa, municipio y descripción de la obra.

Planeación de obras

2016 --Programa-- --Municipio--

Registros: 883 | Monto de inversión: 1,169,107,554

Clave	CCT	Escuela	Localidad	Docimicilio	Meta	Inversion	Municipio	Nivel	Latitud	Longitud
13-UT-0002	26EUT0005Z	UT PTO. PEÑASCO	PTO. PEÑASCO	N/A	MOBILIARIO BASICO	\$3,000,000.00	Puerto Peñasco	Superior		
14-FMS-088	26ETC0012T	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD ESPERANZA CAJEME	ESPERANZA	QUERETARO Y GRACIANO SANCHEZ	REHAB SISTEMA DE ILLUM(240 DE 32W, 60 DE 39W, 25 DE 40W, 8 DE 500W), DIAGNOSTICO Y REP DE SIST ELECT EN LAB DE COMPUTO NO2, EDIF H, EDIF D.A.- REP DE C PERIM, SUST DE PUERTAS (3) Y LAMP ARBOTANTES (5).- COLOC MALLA P ESP DE BASURA .	\$1,489,239.00	Cajeme	Medio Superior		
14-FMS-090	26ECB0008R	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PROF. ERNESTO LOPEZ RIESGO	HERMOSILLO	VERACRUZ FINAL ORIENTE	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICICO	\$2,111,237.00	Hermosillo	Medio Superior		
14-FMS-091	26ECB0001Y	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL VILLA DE SERIS	HERMOSILLO	AGUSTIN DE VILDOSOLA FINAL SUR	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICICO.	\$1,192,933.00	Hermosillo	Medio Superior		
14-FMS-092	26ECB0007S	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL REFORMA	HERMOSILLO	GUADALUPE VICTORIA Y LUIS ORCI	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICICO.					
14-FMS-093	26ECB0002X	COLEGIO DE BACHILLERES DE NAVOJOA	NAVOJOA	TALAMANTE SIN PROLONG SUR	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICICO.					
15-FC-0001	26DPT0004P	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA UNIDAD	HERMOSILLO	CALLE DE LA PLATA Y CARRETERA A SAHUAJUPE	BARDA PERIFERICA					
15-FC-0005	26EUT0005Z	UT PTO. PEÑASCO	PTO. PEÑASCO	N/A	MOBILIARIO BASICO					
15-FC-0006	26EUT0005Z	UT PTO. PEÑASCO	PTO. PEÑASCO	N/A	MOBILIARIO BASICO					
15-FC-0007	26EUT0005Z	UT PTO. PEÑASCO	PTO. PEÑASCO	N/A	MOBILIARIO BASICO					
15-FC-0008	26EUT0005Z	UT PTO. PEÑASCO	PTO. PEÑASCO	N/A	MOBILIARIO BASICO					

Planeación de obras

AGREGAR NUEVA OBRA

Ejercicio: 2016

Programa: --Seleccione--

Clave ISIE:

CCT:

Escuela:

Localidad:

Municipio: --Seleccione--

Latitud: Longitud:

Domicilio:

Meta original:

Inversión original:

Nivel: --Seleccione--

Jefe Proyectos: --Seleccione--

Mapa - Google Chrome

isiesia.gob.mx/ver-mapa/524/

PROYECTOS

Este Módulo se utiliza para ligar la planta de conjunto de la escuela a la obra respectiva sobre la que se trabajará en el dictamen de las necesidades.

Proyectos									
2016	ECBAS - ES	--Municipio--	Con PC	Buscar Meta/Localidad/Escuela					
Registros: 478 Registros con observaciones: 162 Monto de inversión: 449,569,075									
Clave	CCT	Escuela	Localidad	Docimicilio	Meta	Inversion	Municipio	PC	
16-FP-0001	26DML0046I	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 46	AGUA PRIETA	CALLE PRIMERA AVENIDA 17 Y 18	REHABILITACION GENERAL DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONSTRUCCION DE ANDADORES Y RAMPAS	\$1,100,000.00	Agua Prieta	<input checked="" type="checkbox"/>	
16-FP-0002	26DML0021Z	MARIA DEL CARMEN MONTEVERDE DE D'GVVES	BENJAMIN HILL	MADERO Y DAVILA	IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO Y RED DE DRENAJE, REPARACION DE CERCO PERIMETRAL, REPRACION Y CONSTRUCCION DE ANDADORES, RAMPAS Y BANQUETAS CON BARANDALES.	\$800,000.00	Benjamin Hill	<input checked="" type="checkbox"/>	
16-FP-0003	26DML0040O	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 40	CD. OBREGON	VILLA ITSON Y AMBERES	REHABILITACION GENERAL DE AULAS, CONSTRUCCION DE LETRINA HIDRAULICA, RAMPAS, ANDADORES, VITROPISO.	\$1,100,000.00	Cajeme	<input checked="" type="checkbox"/>	
16-FP-0004	26DML0003K	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 03	CANANEA	NIWOS HEROES SIN	IMPMEABILIZACION DE CUBIERTA, INSTALACIONES ELECTRICAS, PLAFONES, PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE MOD. SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL Y OBRA EXTERIOR.	\$1,100,000.00	Cananea	<input checked="" type="checkbox"/>	
16-FP-0005	26DML0049F	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 49	HERMOSILLO	ALFONSO ARMENTA SN	REHABILITACION GENERAL EN BASE A 8 COMPONENTES	\$500,000.00	Hermosillo	<input checked="" type="checkbox"/>	
16-FP-0006	26EML0012R	INSTITUTO IRIS	HERMOSILLO	CATALANA Y SEVILLANA	REHABILITACION EN AULAS, REHABILITACION EN SERVICIOS SANITARIOS, ANDADORES Y PINTURA BARANDAL EN BARDA.	\$600,000.00	Hermosillo	<input checked="" type="checkbox"/>	
16-FP-0007	26DML0019L	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 19	IMURIS	FRANCISCO VILLA NUM. 66	REHABILITACION GENERAL REHABILITACION MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CISTERNA, CERCO PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTICA .	\$900,000.00	Imuris	<input checked="" type="checkbox"/>	
16-FP-0008	26DML0055Q	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 55	HEROICA NOGALES	PASEO SINUOSO S/N	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIONES ELECTRICAS, ANDADORES, RANPA, CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA, ILUMINACION DE TEJABAN, BARDA PERIMETRAL.	\$1,350,000.00	Nogales	<input checked="" type="checkbox"/>	
16-FP-0009	26DML0004J	CAM LA MONTAWA	PTO. PEÑASCO	LOPEZ MATEOS Y CAMPODONICO	REHABILITACION EN AULAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR	\$900,000.00	Puerto Peñasco	<input checked="" type="checkbox"/>	
16-FP-0010	26DML0056P	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 56	S.I.R.M.	VENUSTIANO CARRANZA Y BACA CALDERON S/N	PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, ALIMENTACION HIDRÁULICA Y ELECTRICA, CASETA DE PROTECCION, ABASTECIMIENTO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, RAMPAS DE TRANSICION, SALIDA DE TELEFONIA, VOZ Y DATOS.	\$1,100,000.00	San Ignacio Río Muerto	<input checked="" type="checkbox"/>	
16-FP-0011	26DML0038Z	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 38	LUIS B. SANCHEZ	JUAREZ Y ALDAMA S/N	CONSTR DE BEBEDERO, CISTERNA Y ANDADOR EN OBRA EXTERIOR Y REHAB GRAL DE AULAS, SERV SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO.	\$900,000.00	San Luis Río Colorado	<input checked="" type="checkbox"/>	
16-FP-0012	26DML0042M	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 42	S.L.R.C.	AVENIDA KINO Y CALLE 37	REHABILITACION GENERAL DE AULAS, MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, AIRES ACONDICIONADOS, RAMPAS, ANDADORES Y OBRA EXTERIOR	\$1,100,000.00	San Luis Río Colorado	<input checked="" type="checkbox"/>	
16-FP-0013	26DML0060B	CAM 60	S.L.R.C.	N/A	REHABILITACION GENERAL DE AULAS, REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR	\$900,000.00	San Luis Río Colorado	<input checked="" type="checkbox"/>	

DICTAMINACIÓN

- En este Módulo se da de alta el archivo que contiene el dictamen con las necesidades del plantel.
- Cuenta con la posibilidad de que el dictaminador y el revisor de los mismos intercambien comunicación a través de una columna de observaciones.

Dictaminación

2016 ▾ ECBAS - ES ▾ --Municipio-- ▾ Con Dictame ▾ --Seleccione- ▾ Buscar Meta/Localidad/Escuela 🔍

Asignación dictaminador | Agregar Dictamen | Agregar Observacion | Validar dictamen | Mapa | Descargar Eje. Dicta.

Registros: 493 | Registros con observaciones: 162 | Monto de inversión: 461,248,644

Clave	CCT	Escuela	Localidad	Docimicilio	Meta	Inversion	Municipio	PC	Dict.	Obs	Valid. Dict.	Valid. Obras	Valid. Técnica
15-FP-0080	26DCC0001Y	EL RANCHITO	EL RECODO	CONOCIDO	MEJORAMIENTO	\$479,568.70	Navojas	✖	✔	✖	✖	✖	✖
16-FP-0001	26DML0048I	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 46	AGUA PRIETA	CALLE PRIMERA AVENIDA 17 Y 18	REHABILITACION GENERAL DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONSTRUCCION DE ANDADORES Y RAMPAS	\$1,100,000.00	Agua Prieta	✔	✔	✖	✔	✔	✖
16-FP-0002	26DML0021Z	MARIA DEL CARMEN MONTEVERDE DE D'GYVES	BENJAMIN HILL	MADERO Y DAVILA	IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO Y RED DE DRENAJE, REPARACION DE CERCO PERIMETRAL, REPARACION Y CONSTRUCCION DE ANDADORES, RAMPAS Y BANQUETAS CON BARANDALES.	\$800,000.00	Benjamin Hill	✔	✔	✖	✔	✔	✖
16-FP-0003	26DML0040O	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 40	CD. OBREGON	VILLA ITSON Y AMBERES	REHABILITACION GENERAL DE AULAS, CONSTRUCCION DE LETRINA HIDRAULICA, RAMPAS, ANDADORES, VITROPISO.	\$1,100,000.00	Cajeme	✔	✔	⚠	✔	✔	✖
16-FP-0004	26DML0003K	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 03	CANANEA	NINOS HEROES S/N	IMPREMEABILIZACION DE CUBIERTA, INSTALACIONES ELECTRICAS, PLAFONES, PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE MOD. SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL Y OBRA EXTERIOR.	\$1,100,000.00	Cananea	✔	✔	✖	✔	✔	✔
16-FP-0005	26DML0049F	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 49	HERMOSILLO	ALFONSO ARMENTA S/N	REHABILITACION GENERAL EN BASE A 8 COMPONENTES	\$500,000.00	Hermosillo	✔	✔	⚠	✔	✔	✖
16-FP-0006	26EML0012R	INSTITUTO IRIS	HERMOSILLO	CATALANA Y SEVILLANA	REHABILITACION EN AULAS, REHABILITACION EN SERVICIOS SANITARIOS, ANDADORES Y PINTURA BARANDAL EN BARRDA.	\$600,000.00	Hermosillo	✔	✔	⚠	✔	✔	✖
16-FP-0007	26DML0019L	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 19	IMURIS	FRANCISCO VILLA NUM. 66	REHABILITACION GENERAL, REHABILITACION MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CISTERNA, CERCO PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTICA .	\$900,000.00	Imuris	✔	✔	✖	✔	✔	✖
16-FP-0008	26DML0055Q	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 55	HEROICA NOGALES	PASEO SINUOSO S/N	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIONES ELECTRICAS, ANDADORES, RAMPA, CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA, ILUMINACION DE TEJABAN, BARRDA PERIMETRAL.	\$1,350,000.00	Nogales	✔	✔	✖	✔	✔	✖
16-FP-0009	26DML0004J	CAM LA MONTAÑA	PTO. PEÑASCO	LOPEZ MATEOS Y CAMPODONICO	REHABILITACION EN AULAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR	\$900,000.00	Puerto Peñasco	✔	✔	✖	✔	✔	✖
16-FP-0010	26DML00056P	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 56	S.J.R.M.	VENUSTIANO CARRANZA Y BACA CALDERON S/N	PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, EQUIPO HIDRONEUMATICO, ALIMENTACION HIDRAULICA Y ELECTRICA, CASETA DE PROTECCION, ABASTECIMIENTO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, RAMPAS DE TRANSICION, SALIDA DE TELEFONIA, VOZ Y DATOS.	\$1,100,000.00	San Ignacio Río Muerto	✔	✔	⚠	✔	✔	✔
16-FP-0011	26DML0038Z	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 38	LUIS B. SANCHEZ	JUAREZ Y ALDAMA S/N	CONSTR DE BEBEDERO, CISTERNA Y ANDADOR EN OBRA EXTERIOR Y REHAB GRAL DE AULAS, SERV SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO.	\$900,000.00	San Luis Río Colorado	✔	✔	✖	✔	✔	✔
16-FP-0012	26DML0042M	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 42	S.L.R.C.	AVENIDA KINO Y CALLE 37	REHABILITACION GENERAL DE AULAS, MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, AIRES ACONDICIONADOS, RAMPAS, ANDADORES Y OBRA EXTERIOR	\$1,100,000.00	San Luis Río Colorado	✔	✔	✖	✔	✔	✔
16-FP-0013	26DML0006O	CAM 60	S.L.R.C.	N/A	REHABILITACION GENERAL DE AULAS, REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR	\$900,000.00	San Luis Río Colorado	✔	✔	✖	✔	✔	✔
16-FP-0014	26DML0012S	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 12	SANTA ANA	CALLE 14 S/N FINAL	IREHABILITACION MENOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS, CONSTRUCCION DE PISOS EN EXTERIOR, COLOCACION DE BARANDAL EN RAMPA DE ACCESO Y FORZAMIENTO DE BARRDA EXISTENTE.	\$900,000.00	Santa Ana	✔	✔	✖	✔	✔	✔

VALIDACIÓN

Una vez recibidos los dictámenes, en este módulo se lleva a cabo su validación por parte del área técnica y de obras, además de la integración de los planos del proyecto cuando aplique.

Validación

2016 --Programa-- --Municipio-- Validada Obr Buscar Meta/Localidad/Escuela

Registros: 496 Registros con observaciones: 163 Monto de inversión: 463,213,088

Clave	CCT	Escuela	Localidad	Docimicilio	Meta	Inversion	Municipio	PC	Dict.	Obs	Valid. Dict.	Valid. Obras	Valid. Técnica	Proyecto
15-FE-0177	26DJN0195R	ADA M ELFLEIN	H. GUAYMAS	AVENIDA 17 Y CALLE 22	REHABILITACION DE AULAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y BAÑOS Y OBRA EXTERIOR.	\$1,100,636.00	Guaymas	✗	✓	⚠	✓	✓	✓	✗
15-FE-0184	26DJN0016P	ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER	LUIS B. SANCHEZ	GUERRERO Y KINO	REPARACION GENERAL DE SERVICIOS SASNITARIOS Y CISTERNA Y EQUIPO HIDRONEUMATICO	\$313,271.00	San Luis Rio Colorado	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗
15-FE-0211	26DCC0025H	LA COMARCA	RANCHO CAMARGO	CONOCIDO	SUSTITUCION DE TECHO DEUNA AULA Y CONSTRUCCION DE CISTERNA DE SERV SANITARIOS.	\$530,106.00	Navojoa	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗
16-FC-0091	26DML0042M	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 42	S.L.R.C.	AVENIDA KINO Y CALLE 37	CONSTRUCCION DE UN AULA	\$500,000.00	San Luis Rio Colorado	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗
16-FP-0001	26DML0046I	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 46	AGUA PRIETA	CALLE PRIMERA AVENIDA 17 Y 18	REHABILITACION GENERAL DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONSTRUCCION DE ANDADORES Y RAMPAS	\$1,100,000.00	Agua Prieta	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
16-FP-0002	26DML0021Z	MARIA DEL CARMEN MONTEVERDE DE D'GYVES	BENJAMIN HILL	MADERO Y DAVILA	IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO Y RED DE DRENAJE, REPARACION DE CERCO PERIMETRAL, REPRACION Y CONSTRUCCION DE ANDADORES, RAMPAS Y BANQUETAS CON BARANDALES.	\$800,000.00	Benjamín Hill	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
16-FP-0003	26DML0040O	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 40	CD. OBREGON	VILLA ITSON Y AMBERES	REHABILITACION GENERAL DE AULAS, CONSTRUCCION DE LETRINA HIDRAULICA, RAMPAS, ANDADORES, VITROPISIO.	\$1,100,000.00	Cajeme	✓	✓	⚠	✓	✓	✗	✗
16-FP-0004	26DML0003K	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 03	CANANEA	NWOS HEROES SIN	IMPREMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA, INSTALACIONES ELECTRICAS, PLAFONES, PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE MOO. SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL Y OBRA EXTERIOR.	\$1,100,000.00	Cananea	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
16-FP-0005	26DML0049F	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 49	HERMOSILLO	ALFONSO ARMENTA SN	REHABILITACION GENERAL EN BASE A 8 COMPONENTES	\$500,000.00	Hermosillo	✓	✓	⚠	✓	✓	✗	✗
16-FP-0006	26EML0012R	INSTITUTO IRIS	HERMOSILLO	CATALANA Y SEVILLANA	REHABILITACIÓN EN AULAS, REHABILITACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS, ANDADORES Y PINTURA BARANDAL EN BARRDA.	\$600,000.00	Hermosillo	✓	✓	⚠	✓	✓	✗	✗
16-FP-0007	26DML0019L	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 19	IMURIS	FRANCISCO VILLA NUM. 66	REHABILITACION GENERAL,REHABILITACION MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS,CONSTRUCCION DE CISTERNA,CERCO PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTICA .	\$900,000.00	Imuris	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
16-FP-0008	26DML0055Q	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 55	HEROICA NOGALES	PASEO SINUOSO S/N	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIONES ELECTRICAS, ANDADORES, RAMPA, CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA, ILUMINACION DE TEJABAN, BARRDA PERIMETRAL.	\$1,350,000.00	Nogales	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
16-FP-0009	26DML0004J	CAM LA MONTAWA	PTO. PEÑASCO	LOPEZ MATEOS Y CAMPODONICO	REHABILITACION EN AULAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR	\$900,000.00	Puerto Peñasco	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
16-FP-0010	26DML0056P	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 56	S.I.R.M.	VENUSTIANO CARRANZA Y BACA CALDERON S/N	PINTURA GENERAL, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPO HIDRONEUMATICO, ALIMENTACION HIDRAULICA Y ELECTRICA, CASETA DE PROTECCION, ABASTECIMIENTO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, RAMPAS DE TRANSICION, SALIDA DE TELEFONIA, VOZ Y DATOS.	\$1,100,000.00	San Ignacio Rio Muerto	✓	✓	⚠	✓	✓	✓	✓

Observaciones Validar

PRESUPUESTACIÓN

Con el dictamen validado y los planos de proyecto integrados, en este módulo se integra y valida el presupuesto de la obra.

Presupuesto

2016 --Programa-- --Municipio-- Con presupu --Filtro--

Registros: 12 | Monto de inversión: 11,850,000

					Asignar anafista	Agregar presupuesto	Obs presupuesto	Validación	Agregar Archivos	Obs archivos	Validación Final	Formt. V	Formt. VI	Formt. Planteles		
Clave	CCT	Escuela	Localidad	Docimicilio	Meta	Inversion	Municipio	PC	Dict.	Valid. Técnica	Presupuesto	Obs Presup	Valid. Presup	Arch. Presup	Obs Archivos	Valid. Final
16-FP-0010	26DML0056P	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 56	S.I.R.M.	VENUSTIANO CARRANZA Y BACA CALDERON S/N	PINTURA GENERAL, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA, CASETA DE PROTECCIÓN, ABASTECIMIENTO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, RAMPAS DE TRANSICION, SALIDA DE TELEFONIA, VOZ Y DATOS.	\$1,100,000.00	San Ignacio Rio Muerta	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
16-FP-0056	26DJN0184L	ALBERT EINSTEIN	31 DE OCTUBRE	CONOCIDO	REPARACION DE MUROS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR.	\$900,000.00	Cajeme	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
16-FP-0065	26DJN0449C	LIBERTAD	CD. OBREGON	PAPAGAYO Y SAN FDO	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA, REHABILITACION ELECTRICA GENERAL, PINTURA GENERAL, REHABILITACION MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, CONSTRUCCION DE RAMPAS Y CONSTRUCCION DE BARRA MURO REJA	\$1,200,000.00	Cajeme	✓	✓	✓	✓	⚠	✗	✗	✗	✗
16-FP-0147	26DJN0600I	PROF. RAMON G. BONFIL	HERMOSILLO	COSTA OESTE Y COSTA DE MARFIL	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y REPARACIÓN DE PUERTAS, REHABILITACION MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, DEMOLICION DE BEBEDERO, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, BARANDAL EN RAMPAS Y PINTURA EN ACCESO, ALUMBRADO EN TEJABAN, CONSTRUCCION DE BARRA M	\$750,000.00	Hermosillo	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
16-FP-0177	26DCC0014B	EL FUTURO	EL RIITO MAZARAY	CONOCIDO	CONSTRUCCION DE TEJEBAN, CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA, CONSTRUCCION DE CERCO, PINTURA EN GENERAL Y ALIMENTACION HIDRONEUMATICO	\$900,000.00	Huatabampo	✓	✓	✓	✓	⚠	✗	✗	✗	✗
16-FP-0217	26DCC0025H	LA COMARCA	RANCHO CAMARGO	CONOCIDO	REHABILITACION DE PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AULAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SALIDAS DE VOZ Y DATOS, ACOMETIDA, PISOS EN CANCHA CIVICA Y TEJABAN.	\$750,000.00	Navojoa	✓	✓	✓	✓	⚠	✗	✗	✗	✗
16-FP-0222	26DCC0038L	U-ILI-SEWA	ETCHOHUJAQUILA	CONOCIDO	SUSTITUCION DE TECHOS, REHABILITACION DE CANCELERIA, REHABILITACION DE SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS, INTERNET Y TELEFONIA, CONSTRUCCION DE TEJABAN Y CERCO PERIMETRAL.	\$900,000.00	Navojoa	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
16-FP-0236	26DJN0151U	CARLOS DICKENS	NAVOJOA	NACAPUL Y 21 DE MARZO	REHABILITACION DE PINTURA EN EDIFICIOS, AIRES ACONDICIONADOS, ANDADORES, ACOMETIDA, ALIMENTACION ELÉCTRICA Y CONSTRUCCION DE CISTERNA.	\$1,100,000.00	Navojoa	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
16-FP-0244	26DJN0384J	ALFRED NOBEL	NAVOJOA	PITHAYA NUM. 214 Y JACARANDAS	R REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, AIRES ACONDICIONADOS Y CONSTRUCCION DE ANDADORES.	\$1,100,000.00	Navojoa	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
16-FP-0310	26DJN0437Y	JUANA DE IBARBOUROU	YECORA	CABORCA NUM. 604	COLOCACION DE VITROPISO EN AULA, PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE RAMPAS	\$1,100,000.00	Yécora	✓	✓	✓	✓	⚠	✗	✗	✗	✗
16-FP-0312	26DPR1013P	MIGUEL HIDALGO	LOMA DE BACUM	CONOCIDO	CONSTRUCCION DE SUBESTACION, PINTURA Y REHAB. ELÉCTRICA.	\$1,300,000.00	Bácum	✓	✓	✓	✓	⚠	✗	✗	✗	✗
16-FP-0406	26DPB0103Z	LAZARO CÁRDENAS	CHIJUBAMPO	CONOCIDO	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELÉCTRICO, AULAS, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA GENERAL.	\$750,000.00	Huatabampo	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

CONTRATOS

El Módulo de contratos permite importar o registrar para su control y seguimiento cada uno de los contratos que celebra el ISIE, presenta una lista con los datos más relevantes de cada uno.

Contratos

2016 --Programa-- --Municipio-- --Seleccione-- --Seleccione-- Buscar Numero/objeto/escuela/en

Registros: 706 Monto de inversión: 877,035,721

Importar Importar Avances Nuevo Contrato Editar Borrar Agrupador Agregar Proyecto Agregar Catalogo Exportar Contratos Exportar todo

Fecha	Numero Contrato	Escuela	Objeto	Contratista	Supervisor	Monto	Fecha Inicio	Fecha Término	Fec. Ant.	Fec. Prorrog	% Av prog	% Av Real	Fecha Av.	Proy	Cat	Fin
04/11/2016	ISIE-FAMEB-16-172	GENERAL FAUSTO TOPETE	(16-GT-0046) REHABILITACIÓN MAYOR DE AULAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS Y AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FAUSTO TOPETE, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	PIXO ACABADOS Y CONCRETOS,S.A. DE C.V.		5,291,243.52	07/11/2016	31/12/2016	00/00/0	31/12/2016	0.00%	0%		✗	✓	✗
03/11/2016	ISIE-ITPP-16-001	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	(16-CONV-01) CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	ARQ. RENE TOMAS ROMERO ARREDONDO		970,000.00	04/11/2016	02/01/2017	00/00/0	02/01/2017	5.08%	0%		✗	✗	✗
01/11/2016	ISIE-FAMES-16-007	LT. GUAYMAS (RAT)	(16-UE-0008) CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE UN NIVEL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUAYMAS, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		6,710,600.00	02/11/2016	31/03/2017	00/00/0	31/03/2017	3.36%	0%		✗	✓	✗
28/10/2016	ISIE-FAMES-16-011	CECYTES POB M ALEMAN (RAT)	(16-FMS-017) CONSTRUCCION DE UN AULA DE 2.0 ENTRE EJES EN CECYTES POBLADO MIGUEL ALEMAN, DE LA LOCALIDAD DE POBLADO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	GST CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.		787,475.12	29/10/2016	27/12/2016	00/00/0	27/12/2016	15.25%	0%		✗	✗	✗
27/10/2016	ISIE-NC-16-044	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUA PRIETA	(11-IT-0001) ALIMENTADORES ELÉCTRICOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUA PRIETA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.	DALAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		372,930.93	28/10/2016	26/11/2016	00/00/0	26/11/2016	34.48%	0%		✓	✗	✗
24/10/2016	ISIE-FONDEN-16-034	DEPORTIVO CHOYAL	(16-NW-1001) SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA PERIMETRAL DAÑADA POR FUERTES VIENTOS, EN LA UNIDAD DEPORTIVA "EL CHOYAL" DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	ARQ. LOPE SARACHO CASTAÑOS	229,504.63	25/10/2016	23/11/2016	00/00/0	23/11/2016	44.83%	90%	31/10/2016	✗	✗	✗
24/10/2016	ISIE-FONDEN-16-022	JACINTO BENAVENTE	(16-NW-1006) RETIRO DE LAMINAS Y ESTRUCTURAS DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS JACINTO BENAVENTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GUAYMAS,SONORA.	EDIFICACIONES OMMA, S.A. DE C.V.		21,368.42	25/10/2016	23/11/2016	00/00/0	23/11/2016	44.83%	0%		✗	✗	✗
24/10/2016	ISIE-FONDEN-16-029	MOTOLINIA	(16-NW-1009) CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN LADO NORTE DEL PLANTEL EN JARDIN DE NIÑOS MOTOLINIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GUAYMAS,SONORA.	PROYECTOS INTEGRALES Y ASOCIADOS DE GUAYMAS,S.A. DE C.V.		115,114.72	25/10/2016	23/11/2016	00/00/0	23/11/2016	44.83%	0%		✗	✗	✗
24/10/2016	ISIE-FONDEN-16-028	MARIA LUISA ALCOTT	(16-NW-1008) INSTALACION DE MUFA ELECTRICA, TALA Y RETIRO DE ARBOLES CAIDOS PROVOCADOS POR FUERTES VIENTOS, ES JARDIN DE NIÑOS MARIA LUISA ALCOTT, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	INMOBILIARIA VILMO,S.A. DE C.V.		99,999.93	25/10/2016	23/11/2016	00/00/0	23/11/2016	44.83%	0%		✗	✗	✗
24/10/2016	ISIE-FONDEN-16-026	HEROES DE LA INDEPENDENCIA	(16-NW-1005) TALA Y RETIRO DE ARBOL, RETIRO DE ASTA DE BANDERA, SUSTITUCION DE MALLA DAÑADO POR FUERTES VIENTOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROES DE LA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	EDIFICACIONES OMMA, S.A. DE C.V.		85,557.77	25/10/2016	23/11/2016	00/00/0	23/11/2016	44.83%	0%		✗	✗	✗
24/10/2016	ISIE-FONDEN-16-031	PETRA L DE RODRIGUEZ	(16-NW-0031) RETIRO DE LAMINAS Y ESTRUCTURA DE TEJABAN, LIMPIEZA DEL AREA AFECTADA, EN ESCUELA PRIMARIA PETRA LUJAN DE RODRIGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	PROYECTOS INTEGRALES Y ASOCIADOS DE GUAYMAS,S.A. DE C.V.		63,400.99	25/10/2016	23/11/2016	00/00/0	23/11/2016	44.83%	0%		✗	✗	✗

SUPERVISIÓN

Conserva un registro de cada uno de los informes de cada visita del supervisor a las obras.

Supervisión de obra

ISIE-FAMEB-16-082

(16-FC-0088) CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA CON DIVISIÓN EN "T" EN JARDIN DE NIÑOS MICAELA MUNGUÍA RIVAS USAER 122, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

Nuevo Reporte Regresar

#	Fecha	Avance Financiero Real	Avance Financiero Prog.	Avance Físico Real	Avance Físico Prog.	Comentario	Calidad	Problema
11	04/07/2016	30%	100%	100%	100%	CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRE Y SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS TERMINADOS AL 100%.	Bueno	    
10	29/06/2016	30%	100%	98%	100%	CON ESTA FECHA SE PRESENTAN AVANCES EN LA OBRA Y A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS TRABAJOS.	Bueno	    
9	21/06/2016	30%	100%	75%	100%	CON ESTA FECHA SE PRESENTAN AVANCES EN LA OBRA Y A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.	Bueno	    
8	15/06/2016	30%	100%	55%	100%	CON ESTA FECHA SE PRESENTAN AVANCES EN LA OBRA Y A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS TRABAJOS.	Bueno	    
7	08/06/2016	30%	30%	45%	30%	CON ESTA FECHA SE PRESENTAN AVANCES EN LA OBRA Y A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE LOS TRABAJOS.	Bueno	    
6	31/05/2016	30%	30%	40%	30%	CON ESTA FECHA SE PRESENTAN AVANCES EN LA OBRA Y A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS TRABAJOS.	Bueno	    
5	23/05/2016	30%	30%	35%	30%	CON ESTA FECHA SE PRESENTAN AVANCES EN LA OBRA Y A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN LOS QUE SE TRABAJAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA PARA USAER 122.	Bueno	    
4	17/05/2016	30%	30%	20%	30%	CON ESTA FECHA SE PRESENTAN AVANCES EN LA OBRA Y A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO EN LA OBRA.	Bueno	    
3	09/05/2016	30%	30%	12%	30%	CON ESTA FECHA SE PRESENTAN AVANCES EN LA OBRA Y A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO EN LA OBRA.	Bueno	    
2	03/05/2016	0%	0%	3%	0%	CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA Y SE PRESENTAN AVANCES RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA CON DIVISIÓN EN "T", A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTA OBRA NO CUENTA CON ANTICIPO.	Bueno	    
1	28/04/2016	0%	0%	1%	0%	CON ESTA FECHA SE LE DA TRAZO AL CONTRATISTA EN LA OBRA Y SE OBSERVA QUE UNA DE LAS COLUMNAS DEL TEJABAN EXISTENTE ESTA INVADIENDO EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL AULA ADOSADA PROPUESTA. POR LO QUE SE HARÁ UN CAMBIO DE PROYECTO RESPETANDO EL MONTO CONTRATADO Y LA META DEL PROYECTO.	Bueno	    

Supervisión de obra

Regresar Imprimir

Informe de Avance

11

Al 04/07/2016
ISIE-FAMEB-16-082
(16-FC-0088) CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA CON DIVISIÓN EN "T" EN JARDIN DE NIÑOS MICAELA MUNGUÍA RIVAS USAER 122, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.
SUPERVISOR: ISMAEL GONZALEZ LEM

Avances:

	Avance Físico
% Real	100%

Comentario:

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRE Y SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS TERMINADOS AL 100%.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES FUNCIONAMIENTO 100%

CONSTRUCCION DE AULAS - 100%

Comentarios: CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA Y SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS TERMINADOS AL 100%.



ESTADÍSTICAS

Brinda estadísticas de acuerdo al avance físico de los contratos agrupando por Programa de inversión, municipio, contratista, supervisor y nivel educativo.

Estadísticas

Todos ▾ Agrupar por: ▾ **Buscar**

Agrupar por:

- Programa
- Municipio
- Contratista
- Agrupador
- Supervisor
- Nivel

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa **EC Flow** ISMAEL ACEVEDO Ayuda Salir

Estadísticas


Todos ▾ Programa ▾ **Buscar** [Imprimir](#) [Exportar Excel](#)

Concepto	Total			0%			1%-20%			21%-40%			41%-60%			61%-80%			81%-99%			100%		
	Obras	Aulas	Importe	Obras	Aulas	Importe	Obras	Aulas	Importe	Obras	Aulas	Importe	Obras	Aulas	Importe	Obras	Aulas	Importe	Obras	Aulas	Importe	Obras	Aulas	Importe
ESCUELAS AL CIEN BASICO	315	0	245,164,346	15	0	9,471,688	25	0	22,231,501	32	0	25,016,641	28	0	22,190,269	34	0	27,440,625	60	0	51,272,284	121	0	87,541,358
ESCUELAS AL CIEN MEDIO SUPERIOR	7	0	7,489,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,133,573	5	0	4,368,246
ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR	10	0	172,616,644	0	0	0	3	0	82,264,781	0	0	0	2	0	37,444,281	2	0	25,111,683	1	0	25,782,998	2	0	2,012,903
ESTATAL DIRECTO	61	0	86,202,017	3	0	3,860,959	1	0	177,584	0	0	0	5	0	8,372,750	3	0	8,638,912	10	0	16,574,073	39	0	28,577,739
FAFEF	39	0	40,859,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,740,418	2	0	1,823,963	5	0	7,835,947	30	0	25,459,068
FAM EDUCACIÓN BÁSICA	271	0	199,083,258	4	0	5,458,197	1	0	200,382	3	0	2,979,519	1	0	1,572,303	1	0	567,578	13	0	17,507,679	248	0	170,797,602
FAM EDUCACION MEDIA SUPERIOR	10	0	15,508,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,248,256	0	0	0	9	0	11,260,254
FAM EDUCACION SUPERIOR	10	0	47,068,080	2	0	16,991,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12,242,138	1	0	6,613,698	4	0	11,520,399
FONDEN	23	0	6,825,028	11	0	3,708,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	3,116,839
NORMAL CONVENIDO	42	0	147,230,686	1	0	2,639,920	5	0	35,835,839	5	0	35,525,155	6	0	33,948,639	1	0	3,051,324	10	0	18,075,668	14	0	18,154,144
OTROS EDUCACION BASICA	3	0	11,870,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,603,397	0	0	0	2	0	4,267,365
OTROS EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1	0	2,651,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,651,656
OTROS EDUCACION SUPERIOR	7	0	19,785,190	3	0	12,848,506	0	0	0	1	0	3,187,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,751,601
RECURSOS PROPIOS	5	0	3,309,882	5	0	3,309,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total:	804	0	985,665,250	44	0	57,987,130	35	0	140,710,088	41	0	66,708,397	44	0	109,268,659	48	0	90,727,872	102	0	146,795,913	490	0	373,467,190

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

- Se organizó y aseguró la atención de únicamente las Escuelas previamente planificadas.
- Facilitó la interacción entre los responsables de la integración de los proyectos constructivos y el acceso a los archivos digitales del proceso.
- Organizó la ejecución de los trabajos en cada Escuela conforme a los ocho componentes de atención y sus respectivos subcomponentes.
- Mejoró la Supervisión de la calidad de las obras en ejecución, proporcionando información en tiempo real de avances físico-financieros a los funcionarios responsables.
- Se conservó a la memoria digital de las mejoras efectuadas a cada Escuela, lo que facilita las acciones de atención a solicitudes de acceso a la información pública y transparencia.

eSTIM@TICO



Generación de Estimaciones



Sistema para la Generación Automática de Estimaciones de Obra

VENTANA DE CONTRATOS

Se localiza el contrato de interés según el contratista y año

Seleccione el Contrato y Función a Ejecutar

PIECO PROYECTOS DE INTERMEDIACION ECONOMICOS,S.A. DE C.V.

2016



Contrato	Descripción	Sector	Escuela	Localidad	Importe Cont	Total Antic
ISIE-FP100-16-283 (16-FP-0166)	REHABILITACION DEL PLANTEL	JARDIN DE NI	J.N. PROFA. DOLORES	HERMOSILLO	621,374.41	21
ISIE-FP100-16-207	REHAB. DE INSTAL. ELETR., REF	PRIMARIA	E.P. PROF. ANGEL ARF	HERMOSILLO	704,574.85	24
ISIE-FP100-16-283 (16-FP-0395)	REHABILITACION DEL PLANTEL	PRIMARIA	E.P. MARIA CANDELAF	HERMOSILLO	607,874.52	21
ISIE-FP100-16-283 (16-FP-0461)	REHABILITACION DEL PLANTEL	SECUNDARIA	ESC. SEC. DOROTEO F	HERMOSILLO	660,853.89	22
ISIE-FAMEB-16-101	CONSTRUCCION DE UNA AULA	JARDIN DE NI	NUEVA CREACIÓN RO	HERMOSILLO	359,720.50	12
ISIE-FAMEB-16-102	CONSTRUCCION DE UNA AULA	JARDIN DE NI	NUEVA CREACIÓN URI	HERMOSILLO	357,455.46	12



Configurar
Contrato



Calendario
Financiero



Catalogo
de Obra



Estado de
Cuenta



Finiquito
de Obra



Estimar
Ahora



Spine



Salir

INFORMACIÓN DE CONTRATO

Se verifican datos del contrato

Configuración del Contrato

Importe Contratado: 704,574.85
Iva: 112,731.98 10%
Total Contrato: 817,306.83 Días: 60
Descripción: (16-FP-0387) REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELETRICAS, REPARACIÓN DE TECHOS, COLUMNAS Y MUROS, PINTURA, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y CANCELERIA Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS,
Rep. Legal:
No. Fianza: Importe Fianza: 0.00 Fecha Fianza:
Afianzadora:

Fechas
Del Contrato: 13/07/2016
Inicio: 14/07/2016
Terminación: 11/09/2016

1er Prórroga
Referencia: ANTICIPO
Del: 11/08/2016
Al: 9/10/2016

2da Prórroga
Referencia:
Del:
Al:


3er Prórroga
Referencia:
Del:
Al:


Anticipo
Anticipo: 211,372.46
Iva Anticipo: 33,819.59
Total Anticipo: 245,192.05 Porcentaje para Inicio: 10 %
Pagado el: 10/08/2016 Porcentaje para Materiales: 20 %
Fianza Anticipo:
Afianzadora:

Devolución de Anticipo
Monto Devuelto: 0.00
Iva Devuelto: 0.00
Total Devuelto: 0.00
Folio Devolución:
Fecha:

Deducciones

	Nombre	Porcentaje	Importe	
1.-	SEFUP	0.50	0.00	<input type="checkbox"/> Calcular Sobre Estim - Amort
2.-		0.00	0.00	<input type="checkbox"/> Calcular Sobre Estim - Amort
3.-		0.00	0.00	<input type="checkbox"/> Calcular Sobre Estim - Amort
4.-		0.00	0.00	<input type="checkbox"/> Calcular Sobre Estim - Amort
5.-		0.00	0.00	<input type="checkbox"/> Calcular Sobre Estim - Amort
6.-		0.00	0.00	<input type="checkbox"/> Calcular Sobre Estim - Amort

 Aceptar

 Cancelar

CALENDARIO FINANCIERO

Se verifica el programa de obra



Calendarario Financiero del Contrato

ISIE-FP 100-16-207

Año	Mes	Programado	Ejecutado	Prog. Acum.	Ejec. Acum.	Dif. Acum.	Retención	Devolución	Sanción
2016	08	29,345.09	354,928.10	29,345.09	354,928.10	325,583.01	0.00	0.00	0.00
2016	09	224,570.14	0.00	253,915.23	354,928.10	101,012.87	0.00	0.00	0.00
2016	10	450,659.62	0.00	704,574.85	354,928.10	-349,646.75	0.00	0.00	0.00

Nuevo Cambiar Borrar

Total : **704,574.85**

 Gráfica de Avance  Cerrar

CATALOGO DE CONCEPTOS

Se asegura que el catálogo de conceptos tenga los conceptos a estimar

Catálogo de Conceptos de Obra del Contrato

25629 ISIE-FP100-16-207

Cap	Capitulo	Subcapitulo	Concepto	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	Total
0101	REHABILITACION	PR.- PRELIM	PR05047	DESMONTAJE DE LAMPARAS INCANDESCENTES O	PZA	112.00000	48.96	5,483.52
0101	REHABILITACION	PR.- PRELIM	PR05150	DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA QO-2, 8, 12	PZA	6.00000	231.88	1,391.28
0101	REHABILITACION	PR.- PRELIM	PR05615	DESMANTELAMIENTO DE APAGADOR O CONTACTO	SAL	96.00000	48.96	4,700.16
0102	REHABILITACION	IE.- INSTALACION	IE51004	SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA DE LAMINA	SAL	28.00000	415.69	11,639.32
0102	REHABILITACION	IE.- INSTALACION	IE51401	CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO	PZA	67.00000	112.27	7,522.09
0102	REHABILITACION	IE.- INSTALACION	IE51407	APAGADOR SENCILLO QUINZIFO COMPLETO CON	PZA	29.00000	133.35	3,867.15
0102	REHABILITACION	IE.- INSTALACION	IE84348	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2x32 W., MARCA	PZA	84.00000	1,661.58	139,572.72
0102	REHABILITACION	IE.- INSTALACION	IE84372	LUMINARIA PARA SOBRE PONER FLUORESCENTE	PZA	28.00000	687.64	19,253.92
0102	REHABILITACION	IE.- INSTALACION	IE85131	RECABLEADO DE SALIDAS DE APAGADOR CON	SAL	29.00000	224.60	6,513.40
0102	REHABILITACION	IE.- INSTALACION	IE85132	RECABLEADO DE SALIDAS DE ALUMBRADO CON	SAL	112.00000	224.60	25,155.20
0102	REHABILITACION	IE.- INSTALACION	IE85133	RECABLEADO DE SALIDAS DE CONTACTO CON 2	SAL	67.00000	313.56	21,008.52
0201	DESMONTAJE DE	PR.- PRELIM	PR08377	DESMONTAJE DE APARATO DE AIRE ACONDICION	PZA	11.00000	305.97	3,365.67
0202	DESMONTAJE DE	AA.- ALBA	AA31112	MURO DE LADRILLO 7x14x28 CM. DE 14 CM. DE E	M2	4.00000	501.83	2,007.32
0202	DESMONTAJE DE	AA.- ALBA	AA32004	APLANADO DE MEZCLA EN MUROS, A BASE DE N	M2	8.00000	173.12	1,384.96
0301	REPARACION DE	PR.- PRELIM	PR03410	DEMOLICION DE APLANADOS DE 2.5 CM. DE ESP	M2	30.00000	30.21	906.30
0301	REPARACION DE	PR.- PRELIM	PR03515	DEMOLICION DE APLANADOS DE 1.00 CM. DE ESP	M2	40.00000	26.25	1,050.00
0302	REPARACION DE	AA.- ALBA	AA32003	APLANADO DE MEZCLA EN MUROS, A BASE DE N	M2	30.00000	196.00	5,880.00
0302	REPARACION DE	AA.- ALBA	AA32014	APLANADO DE MEZCLA EN LECHO BAJO DE LOS	M2	40.00000	235.66	9,426.40

704,574.85
Cambiar

Consultar Nombres de Capítulos
 Importar Catálogo de OPUS
 Generador de Obra
 Exportar Catálogo a Excel
 Borrar Catálogo
 Cerrar

ESTIMACIONES


Se verifica que estimación no haya sido generada previamente.

Estado de Cuenta del Contrato

Importe Contratado : **817,306.83** Anticipo Otorgado : **245,192.05**



Estimaciones:

Numero	Del	Al	Importe	Iva	Importe Total	Amort Ant	Iva Amort	Amort Total
1	11/08/2016	31/08/2016	354,928.10	56,788.50	411,716.60	106,478.43	17,036.55	123,514.98

 [Consultar Estimación](#)

Ultima Estimación del Programa Ultima Estimación del Contrato

Ejercido : **411,716.60** Amortizado : **123,514.98**
Por Ejercer : **405,590.23** Por Amortizar : **121,677.07**

 Imprimir  Cerrar

GENERACIÓN DE ESTIMACIÓN

El Contratista solo entrega generadores firmados por Supervisor.

Pasos para Estimar

Estimación 2

Fecha OK Estimación: 15/11/2016

Del: 1/09/2016 Al: 30/09/2016

Av. Físico: 70.00

Reportes de Supervisión

Av. Fis.: Al:

Ultimo Reporte Registrado

Av. Fis.: Fecha:

% Iva a Utilizar: 16

% Amort. Anticipo: 30.00

Amorizar el Resto del Anticipo

Ultima Estimacion del Contrato

Capturar Cantidades

Analisis de la Información

Impresión de Formatos

Cierre de la Estimación

Salir

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa GENERADOR DE OBRA	CONTRATO No. ISIE-FP100-16-207	PERIODO DE LA ESTIMACION DEL 01-09-16 AL 15-09-16	ESTIMACION No. 2 (DOS)
	DESCRIPCION DE LA OBRA (16-FP-0387) REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REPARACION DE TECHOS, COLUMNAS Y MUROS, PINTURA, SUSTITUCION DE VENTANAS Y CANCELERIA Y COLOCACION DE VITROPISO EN AULAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE PISOS EN EXTERIOR Y REHABILITACION DE BARRA, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ANGEL ARREOLA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO (diam)	ALTO (kg/m.)	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA
PROSD47	DESMONTAJE DE LAMPARAS INCANDESCENTES O FLUORESCENTES VARIAS MEDIDAS, CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, ANDAMIOS Y ACARREOS HASTA BANCO DE CARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (1)	PZA						69.00	69.00
								TOTAL EREC	69.00
								PAGADOS	52.00
								TOTAL	17.00

CROQUIS:

FOTO:

SUPERVISION EXTERNA:
OCEANUS SUPERVISION Y PROYECTOS S DE CV
ING. JOSE ERNESTO RODRIGUEZ FIGUEROA

EL REPRESENTANTE DE SU EMPRESA:
ECONOMICA S DE CV
ING. JOSE ENRIQUE GONZALEZ ASPILU

GENERACIÓN DE ESTIMACIÓN

Se capturan generadores en lista de conceptos autorizados

Captura de Cantidades de Obra Ejecutadas

Estimación No. : 2

Cap	Capítulo	Subcapítulo	Concepto	Descripción	Cantidad Cont	Ac. Anterior	Por Estimar	Esta Estim	Importe
0101	REHABILITACI	PR.- PRELIMIN	PR05047	DESMONTAJE DE LAMPARAS INCANDESCENTES O FLUO	112.00000	52.00000	60.00000	17.00000	832.32
0101	REHABILITACI	PR.- PRELIMIN	PR05150	DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA QO-2, 8, 12,18, 24	6.00000	0.00000	6.00000	0.00000	0.00
0101	REHABILITACI	PR.- PRELIMIN	PR05615	DESMANTELAMIENTO DE APAGADOR O CONTACTO, INC	96.00000	39.00000	57.00000	-4.00000	-195.84
0102	REHABILITACI	IE.- INSTALACI	IE51004	SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA DE LAMINA 4"x4"	28.00000	0.00000	28.00000	0.00000	0.00
0102	REHABILITACI	IE.- INSTALACI	IE51401	CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO DEL TIPO	67.00000	26.00000	41.00000	-8.00000	-898.16
0102	REHABILITACI	IE.- INSTALACI	IE51407	APAGADOR SENCILLO QUINZIDO COMPLETO CON TAPA	29.00000	13.00000	16.00000	4.00000	533.40
0102	REHABILITACI	IE.- INSTALACI	IE84348	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2x32 W., MARCA LITHON	84.00000	52.00000	32.00000	17.00000	28,246.86
0102	REHABILITACI	IE.- INSTALACI	IE84372	LUMINARIA PARA SOBRE PONER FLUORESCENTE COM	28.00000	0.00000	28.00000	0.00000	0.00
0102	REHABILITACI	IE.- INSTALACI	IE85131	RECABLEADO DE SALIDAS DE APAGADOR CON CABLES	29.00000	13.00000	16.00000	4.00000	898.40
0102	REHABILITACI	IE.- INSTALACI	IE85132	RECABLEADO DE SALIDAS DE ALUMBRADO CON CABLES	112.00000	52.00000	60.00000	17.00000	3,818.20
0102	REHABILITACI	IE.- INSTALACI	IE85133	RECABLEADO DE SALIDAS DE CONTACTO CON 2 CABLE	67.00000	26.00000	41.00000	-8.00000	-2,508.48
0201	DESMONTAJE	PR.- PRELIMIN	PR08377	DESMONTAJE DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO D	11.00000	0.00000	11.00000	0.00000	0.00
0202	DESMONTAJE	AA.- ALBADILE	AA31112	MURO DE LADRILLO 7x14x28 CM. DE 14 CM. DE ESPES	4.00000	0.00000	4.00000	0.00000	0.00
0202	DESMONTAJE	AA.- ALBADILE	AA32004	APLANADO DE MEZCLA EN MUROS, A BASE DE MORTE	8.00000	0.00000	8.00000	0.00000	0.00
0301	REPARACION	PR.- PRELIMIN	PR03410	DEMOLICION DE APLANADOS DE 2.5 CM. DE ESPESOR P	30.00000	0.00000	30.00000	0.00000	0.00
0301	REPARACION	PR.- PRELIMIN	PR03515	DEMOLICION DE APLANADOS DE 1.00 CM. DE ESPESOR	40.00000	0.00000	40.00000	0.00000	0.00
0302	REPARACION	AA.- ALBADILE	AA32003	APLANADO DE MEZCLA EN MUROS, A BASE DE MORTE	30.00000	0.00000	30.00000	0.00000	0.00
0302	REPARACION	AA.- ALBADILE	AA32014	APLANADO DE MEZCLA EN LECHO BAJO DE LOSA, A BA	40.00000	0.00000	40.00000	0.00000	0.00
0401	PINTURA	AA.- ALBADILE	AA34151	PINTURA ARQUITECTÓNICA 100% ACR-LICA LAVABLE EN	6,947.90000	3,591.64000	3,356.26000	1,625.94000	88,890.14
0401	PINTURA	AA.- ALBADILE	AA34152	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ULTRARAPIDO 2 MAR	140.00000	152.00000	-12.00000	0.00000	0.00
0401	PINTURA	AA.- ALBADILE	AA34153	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ULTRARAPIDO 2 MAR	120.00000	118.15000	1.85000	0.00000	0.00
0401	PINTURA	AA.- ALBADILE	AA34155	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ULTRARAPIDO 2 MAR	28.00000	29.00000	-1.00000	0.00000	0.00
0401	PINTURA	AA.- ALBADILE	AA34165	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ULTRARAPIDO 2 MAR	140.00000	152.00000	-12.00000	0.00000	0.00
0401	PINTURA	AA.- ALBADILE	AA34166	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ULTRARAPIDO 2 MAR	375.00000	72.00000	303.00000	450.00000	24,088.50

Suma lo Estimado 143,705.34

Cerrar

GENERACIÓN DE ESTIMACIÓN

El Sistema verifica automáticamente que la estimación proceda

Analisis de la Información que se obtendría al Imprimir Esta Estimación

Estado de Cuenta del Contrato (S/IVA)

IMPORTE CONTRATADO	704,574.85
EJERCIDO ANTERIOR	354,928.10
EJERCIDO ESTA ESTIM.	143,705.34
ACUMULADO TOTAL	498,633.44
POR EJERCER	205,941.41

Estado de Cuenta del Anticipo (S/IVA)

ANTICIPO OTORGADO	211,372.46
AMORT. ANTERIOR	106,478.43
AMORT. ESTA ESTIM.	43,111.60
AMORT. TOTAL	149,590.03
SALDO POR AMORT.	61,782.43

Avances

AV. FIS ACUM:	70.00
AV. FIN. ACUM.	70.77

Período

DEL :	1/09/2016
AL :	30/09/2016

Estimación

Deducciones

SEFUP	718.53
-------	--------

ESTIMACION No. : 2

VALOR ESTIMACION	143,705.34
RETENCION	0.00
DEVOLUCION	0.00
AMORTIZACION	43,111.60
SUBTOTAL	100,593.74
IVA	16,095.00
TOTAL FACTURA	116,688.74
TOT. DEDUCCIONES	718.53
SANCION	0.00
IMPORTE LIQUIDO	115,970.21

Contrato : **ISIE-FP100-16-207**

**** SI ** PROCEDE**


Recursos de los que podría ser pagada esta Factura ..

Cve Partida	Fuente	Apartado	Ejercido	Disponible
16,147	FIDECOMISO FAM POTE	817,306.83	533,393.67	283,913.16

Seleccione la partida de donde se va a pagar esta Estimación :

Solicitar Autorización para no usar tope 10%

Código:

 Cerrar

!NOTA : Si no aparece partida disponible, es importante no continuar y dar aviso al responsable de Contratos a efectos de mantener la integridad de nuestra información.

Se generan automáticamente los siguientes formatos:



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ESTIMATIVA DE CONCEPTOS



NOMBRE DE LA OBRA : (16-FP-0387) REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REPARACIÓN DE TECHOS, COLUMNAS Y MUROS, PINTURA, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y CANCELERÍA Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE PISOS EN EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE BARRA, EN ESCUELA

Pag: 1
Fimp.: 15/11/2016
Hora: 3:21 PM

CONTRATO No. **ISIE-FP100-16-207**

PERIODO : DE: 1/09/2016 A: 30/09/2016 AV. FIS. ANT. 60.00 % AV. FIS. ACTUAL 10.00 % AV. FIS. ACUM. 70.00 %

CONTRATISTA PIECO PROYECTOS DE INTERMEDIACION ECONOMICOS,S.A. DE C.V.

CLAVE DE OBRA
16-FP-0387



ESTIMACION No. **2**

FECHA : 15/11/2016

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO	CANTIDADES				IMPORTES			
				CATALOGO	COBRADOS	GENERADO	SALDO	CATALOGO	COBRADOS	GENERADO	SALDO
OBRA NORMAL											
01	REHABILITACION DE MAYOR DE INSTALACIONES EL										
	0101 PR.- PRELIMINAR										
PR05047	DESMONTAJE DE LAMPARAS INCANDESCENTES O FLUORESCENTES VARIAS MEDIDAS, CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, ANDAMIOS Y ACARRE	PZA	48.96	112.00	52.00	17.00000	43.00	5,483.52	2,545.92	832.32	2,105.28
PR05615	DESMANTELAMIENTO DE APAGADOR O CONTACTO, INCLUYE QUITAR APAGADOR O CONTACTO Y DESMANTELAR CABLE DE CONEXIONES. (JJ)	SAL	48.96	96.00	39.00	-4.00000	61.00	4,700.16	1,909.44	-195.84	2,986.56
										PR.- PRELIMINAR 0101	636.48
	0102 IE.- INSTALACION ELECTRICA										
IE51401	CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO DEL TIPO PUESTA A TIERRA, 125V., 15A. CON DOS ENTRADAS PLANAS Y UNA REDONDA, PLACA COLOR MARFIL., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,	PZA	112.27	67.00	26.00	-8.00000	49.00	7,522.09	2,919.02	-898.16	5,501.23
IE51407	APAGADOR SENCILLO QUINZIDO COMPLETO CON TAPA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. (JJ)	PZA	133.35	29.00	13.00	4.00000	12.00	3,867.15	1,733.55	533.40	1,600.20
IE84348	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2x32 W., MARCA LITHONIA O SIMILAR, DE SOBREPONER, EN CUERPO BASE DE FIBRA DE VIDRIO Y DIFUSOR ANTIDESLUMBRANTE DE ACRILICO 100% DE 1.27x0.194m	PZA	1,661.58	84.00	52.00	17.00000	15.00	139,572.72	86,402.16	28,246.86	24,923.70
IE85131	RECABLEADO DE SALIDAS DE APAGADOR CON CABLES LS. MARCA CONDUMEX O MONTERREY, CALIBRE #12, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB)	SAL	224.60	29.00	13.00	4.00000	12.00	6,513.40	2,919.80	898.40	2,695.20
IE85132	RECABLEADO DE SALIDAS DE ALUMBRADO CON CABLES LS MARCA CONDUMEX O MONTERREY CALIBRE #12, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB)	SAL	224.60	112.00	52.00	17.00000	43.00	25,155.20	11,679.20	3,818.20	9,657.80
IE85133	RECABLEADO DE SALIDAS DE CONTACTO CON 2 CABLES LS MARCA CONDUMEX O MONTERREY CALIBRE #10 + 1 CABLE #12, NCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE	SAL	313.56	67.00	26.00	-8.00000	49.00	21,008.52	8,152.56	-2,508.48	15,364.44
										IE.- INSTALACION ELECTRICA 0102	30,090.22
										REHABILITACION DE MAYOR DE INSTALACIONES EL 01	30,726.70
04	PINTURA										
	0401 AA.- ALBADERIA Y ACABADOS										
AA34151	PINTURA ARQUITECTÓNICA 100% ACR-LICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONC., MARCA AXALTA (antes dupont) , LINEA RENZEL O SIMILAR, CUMPLE CON LA NORMA NMX-C-423	M2	54.67	6,947.90	3,591.64	1,625.94000	1,730.32	379,841.69	196,354.96	88,890.14	94,596.59
AA34166	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ULTRARAPIDO 2 MARCA AXALTA (antes dupont) LINEA NOVOPERMO O SIMILAR EN POLINERIA (aulas medida en proyeccion superficie), APLICADA CON EQUI	M2	53.53	375.00	72.00	303.00000	0.00	20,073.75	3,854.16	16,219.59	0.00
										AA.- ALBADERIA Y ACABADOS 0401	105,109.73
										PINTURA 04	105,109.73
										SUBTOTAL OBRA NORMAL	135,836.43

Se generan automáticamente los siguientes formatos:

Carátula de Estimación

		GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA						
		INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
Nombre de la Obra		(16-FP-0387) REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELETRICAS, REPARACIÓN DE TECHOS, COLUMNAS Y MUROS, PINTURA, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y CANCELERIA Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE PISOS EN				No. de Obra		
						16-FP-0387		
Contrato		ISIE-FP100-16-207				Fecha de elaboración		
Ubicación		HERMOSILLO, HERMOSILLO				15 de Noviembre de 2016		
DE LA TEMPORALIDAD								
DEL CONTRATO		REAL		PRORROGA		PERIODO ESTIMACIÓN		2
INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
14/07/2016	11/09/2016	11/08/2016	9/10/2016	11/08/2016	9/10/2016	1/09/2016	30/09/2016	
Nombre de la Empresa		PIECO PROYECTOS DE INTERMEDIACION ECONOMICOS,S.A. DE C.V.				TEL 664-2611880 6621		
Representante		ING. GERMAN GALVEZ GUTIERREZ				RFC PPI1107227S4		
Dirección		CAMPODONICO						
Ciudad		HERMOSILLO,SONORA						
DEL CONTRATO								
VALOR DEL CONTRATO	704,574.85	ANTICIPO		FOLIO DEVOLUCIÓN		FIANZA No.		
IVA 16.00%	112,731.98	OTORGADO	211,372.46	DEVUELTO	0.00			
		IVA	33,819.59	IVA	0.00			
TOTAL	817,306.83	TOTAL	245,192.05	TOTAL	0.00	FECHA		
DE LA ESTIMACIÓN								
	Importes	Porcentaje	VALOR DE ESTIMACIÓN :		DEDUCCIONES			
DEL CONTRATO	704,574.85	100.00 %	143,705.34					
ESTIMADO	498,633.44	70.77 %	RETENCIÓN/DEVOLUCIÓN :		SEFUP 0.50% 718.53			
SALDO	205,941.41	29.23 %	AMORTIZACIÓN ANTICIPO :					
			SUBTOTAL :					
			100,593.74					
			IVA :					
			16,095.00					
			TOTAL FACTURA :					
			116,688.74					
DE LOS IVAS			TOTAL DEDUCCIONES:		TOTAL 718.53			
DEL CONTRATO	112,731.98	100.00 %	718.53					
ESTIMADO	79,781.35	70.77 %	TOTAL SANCION:					
SALDO	32,950.63	29.23 %	0.00					
			IMPORTE LIQUIDO :		FISICO 70.00 %			
			115,970.21		FINANCIERO 70.77 %			
SON: (Ciento Quince Mil Novecientos Setenta pesos 21/100 M.N.)								
Elaboró		Director General de Obras		Encargado del Despacho Dir. General Técnica				
		ING. JOSE FELICIANO MARTINEZ GARCIA		LIC. LUIS ALBERTO LEON DURAZO				
		Director General de Finanzas y Administración		Coordinadora Ejecutiva ISIE				
		C.P. ALEJANDRO TORRES PRECIADO		ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA				

Se generan automáticamente los siguientes formatos:



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



NOMBRE DE LA OBRA: (16-FP-0387) REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELETRICAS, REPARACIÓN DE TECHOS, COLUMNAS Y MUROS, PINTURA, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y CANCELERIA Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE PISOS EN EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE BARRA, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR

No. DE CONTRATO: **ISIE-FP100-16-207**

ESTIMACION No **2**

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

Contratista **PIECO PROYECTOS DE INTERMEDIACION ECONOMICOS,S.A. DE C.V.**

Hoja **1**

Valor de Contrato **704,574.85**

Fecha **15/11/2016**

No.	Estimacion No.	Periodo		Valor de Estimación	Amortización	Retenc/ Devol.	Tot. Factura (inc. IVA)	Sanción	SEFUP	Liquido
		Inicio	Termino							
1	Estimación No. 1	11/08/2016	31/08/2016	354,928.10	106,478.43	0.00	288,201.62	0.00	1,774.64	286,426.98
2	Estimación No. 2	1/09/2016	30/09/2016	143,705.34	43,111.60	0.00	116,688.74	0.00	718.53	115,970.21
	Sumas			498,633.44	149,590.03	0.00	404,890.36	0.00	2,493.17	402,397.19

Director General de Obras

Encargado del Despacho Dir. General Técnica

Director General de Finanzas y Administración

Coordinadora Ejecutiva ISIE

ING. JOSE FELICIANO MARTINEZ GARCIA

LIC. LUIS ALBERTO LEON DURAZO

C.P. ALEJANDRO TORRES PRECIADO

ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA

Se generan automáticamente los siguientes formatos:



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CALCULO DE PENAS CONVENCIONALES SEGUN CONTRATO



CONTRATO No.

ISIE-FP100-16-207

FECHA

13/07/2016

CONTRATISTA

PIECO PROYECTOS DE INTERMEDIACION ECONOMICOS,S.A. DE C.V.

Fecha: 15/11/2016

Hora : 3:21 PM

OBRA

(16-FP-0387) REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELETRICAS, REPARACIÓN DE TECHOS, COLUMNAS Y MUROS, PINTURA, SUSTITUCION DE VENTANAS Y CANCELERIA Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE PISOS EN EXTERIOR Y

FECHA DE INICIO: 14/07/2016

ESTIM. No.

DEL: AL:

FECHA DE TERMINACION: 11/09/2016

2

1/09/2016 30/09/2016

COMPARACION DEL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE CONTRA LO ESTIMADO POR MES

	08-2016	09-2016	10-2016
PROGRAMA MENSUAL	29,345.09	224,570.14	450,659.62
EJECUTADO MENSUAL	354,928.10	143,705.34	
PROGRAMADO ACUMULADO	29,345.09	253,915.23	704,574.85
EJECUTADO ACUMULADO	354,928.10	498,633.44	498,633.44

SANCION POR ATRASO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO (2% DE LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CONTRA LO EJECUTADO)

DIF. EJEC-PROG ACUMULADO 325,583.01 244,718.21 -205,941.41

IMPORTE ACUM. SANCION

IMPORTE SANCION ESTIM.

IMPORTE DEVOLUCION

IMPORTE NO EJERCIDO AL FINAL DEL CONTRATO:

DIAS DE ESTA ESTIMACION:

IMPORTE SANCION:

** Apliquese una

por

0.00

antes de pagar la Estimación

Verificó

ING. JOSE FELICIANO MARTINEZ GARCIA

Director General de Obras

Se generan automáticamente los siguientes formatos:

MODELO DE FACTURA POR ESTA ESTIMACIÓN A PRESENTAR

NOMBRE DEL CONTRATISTA
COMPañÍA
 DIRECCIÓN
 CÓDIGO POSTAL TELEFONO
 R.F.C.
 Hermosillo, Sonora, México

FACTURA No.

FECHA:

NOMBRE: INSTITUTO SONorenSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 DIRECCIÓN: BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO No. 1104 COL. PITIC
 CIUDAD: HERMOSILLO, SONORA. TEL : 214-60-33, 214-61-37
 R.F.C. ISI-980330-SP5 CP : 83150

ESTIMACIÓN No. **2**

CONTRATO No. **ISIE-FP100-16-207**

CLAVE DE OBRA: **16-FP-0387** LOCALIDAD : **HERMOSILLO** MUNICIPIO : **HERMOSILLO**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

(16-FP-0387) REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELETRICAS, REPARACIÓN DE TECHOS, COLUMNAS Y MUROS, PINTURA, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y CANCELERIA Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE PISOS EN EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE BARRA, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ANGEL ARREOLA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

VALOR DE ESTIMACION	143,705.34
RETENCION / DEVOLUCION	0.00
IMPORTE ESTIMADO	143,705.34
(-) AMORT. DE ANTICIPO	43,111.60
SUBTOTAL	100,593.74
I.V.A. 16 %	16,095.00
TOTAL FACTURA	116,688.74
DEDUCCIONES:	%
SEFUP 0.50	718.53
(-) TOTAL DEDUCCIONES	718.53
(-) SANCION	0.00
IMPORTE LIQUIDO	115,970.21

TRANSFERIR AL BANCO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 CLABE INTERBANCARIA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Este Modelo de Factura es para fines informativos de los importes que se deben facturar"

"Es responsabilidad del Contratista que la factura que entregue a ISIE cumpla con todos los requisitos fiscales aplicables, de acuerdo a su Régimen Fiscal, principalmente los vigentes a partir del 1° de Julio de 2012"

SON: (Ciento Dieciséis Mil Seiscientos Ochoenta y Ocho pesos 74/100 M.N.)

R.F.C.:
 CMIC:
 IMSS:
 INFONAVIT:

ESTADO DE CUENTA

Presenta en todo momento el estatus financiero del contrato

Instituto Sonorense de Infraestructura E
Sistema de Información. (Módulo Seguimiento a Programa)
Estado de Cuenta del Contrato: ISIE-FP100-16-207

Fecha: 15/11/2016

Escuela: **16-FP-0387 E.P. PROF. ANGEL ARRIOLA** Contratista: **PIECO PROYECTOS DE INTERMEDIACION ECONOMICOS,S.A. DE C.V.**
 Partida: **REHAB. DE INSTAL. ELETR., REP.** Tipo de Adj.: **AD**
 Meta: **(16-FP-0387) REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELETRICAS, REPARACIÓN DE TECHOS, COLUMNAS Y MUROS, PINTURA, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y CANCELERIA Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN**
 Supervisor:

Importe del Contrato:	817,306.83	Anticipo Otorgado:	243,192.05	Avance a la Fecha:
1a. Ampliación :	0.00	Fecha de Pago:	10/06/2016	Fisico : 100.00%
2a. Ampliación :	0.00	Pagado en:	Pagada en ISIE	Financiero: 65.26%
3a. Ampliación :	0.00			
Total Contratado :	817,306.83			Importe Original del Contrato: 0.00

Estimaciones:

No.	Fecha Est.	Del	Al	Importe	-Ret./+Dev	Amort. Ant.	Subtotal	Iva	Facturado	Dedurr.	Sanción	Líquido Pag.	# Cheque	Pagado en	F. Pago	AvFiz.
1	14/09/2016	11/06/2016	31/06/2016	354,928.10	0.0	106,478.4	248,449.6	39,731.9	288,201.6	1,774.6	0.0	286,426.9				60.00
Totales:				354,928.10	0.0	106,478.4	248,449.6	39,731.9	288,201.6	1,774.6	0.0	286,426.9				

Escalatorias:

No.	Del	Al	Importe	Pagado En
Total de Escalatorias:			0.00	

Gastos Indirectos:

Fecha	Concepto	Importe
Total de Gastos Indirectos:		0.00

Diferimientos y Prórrogas:

No.	Fecha	Referencia	Del	Al	Importe
1	10/06/2016	ANTICIPO	11/06/2016	9/10/2016	0.00
Total de Diferimientos y Prórrogas:					0.00

Ejercido Total:	411,716.60	Por Ejercer del Contrato:	405,590.23	Por Amortizar:	121,677.07
Pagado Total :	245,192.05	Pagado ISIE :	245,192.05	Pagado Hacienda :	0.00



INSTITUTO SONORENSE DE
**INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA**

GOBIERNO
de SONORA



Todos los tramites del ISIE son controlados por esta herramienta

RECIBO DE TRAMITE


Al contratista se le entrega un recibo cada vez que inicia un trámite, con el que podrá consultar su seguimiento vía web.



INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
RECIBO DE TRAMITE



Hemos Recibido su Trámite con los siguientes datos :



Contrato : **ISIE-FP100-16-041**

(15-FP-0052) REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SUMINISTRO DE EQUIPO HIDRONEUMATICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, EN ESCUELA PRIMARIA 19 DE ABRIL, DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

Contratista : **PIECO PROYECTOS DE INTERMEDIACION ECONOMICA**

Tipo de Trámite : **ESTIMACION**

No. : **2** Modalidad del Contrato: Adjudicación Directa
Clave Presupuestal: 15FP0052

Observaciones

Anexos en Estimación

- Copia de Bitácora
- Bitácora Electrónica
- Relación de Conceptos de Obra en Excel que Comprenden esta Estimación
- Oficio de Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios
- Impresión de Avance Físico
- Copia del Programa de Obra

Anexos para Archivo de Trámite

- Pago de Honorarios de Verificación
- Pruebas de Lab. de Concreto (Firmadas por Supervisor)
- Pruebas de Lab. de Compactación (Firmadas por Supervisor)
- Pruebas de Lab. de Soldadura (Firmadas por Supervisor)
- Garantía de Impermeabilización
- Garantía de Equipos Instalados
- Garantía de Vidrios
- Garantía de Fumigación contra Termita
- Foto de Identificación de la Obra

ENTREGA

FATIMA

RECEPCIÓN DE OBRAS

PILAR

En la página web del ISIE en la sección de Contratistas contamos con la opción para la consulta de trámites.

isie.sonora.gob.mx

☎ Teléfono: (662) 214 60 33 ✉ Correo Electrónico: contacto@isie.gob.mx

Inicio Institución Informes y Programas Contratistas Difusión Obras

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL

📅 Jue, 02 de Sep de 2021 📄 Hits: 93 | 📱 f 📱

Predominan en 2021 las obras de rehabilitación en escuelas de educación Básica de Sonora: ISIE

Últimas Noticias

Noticias Anteriores

- 📅 31 de Ago de 2021 | 📱 f 📱
Refuerza ISIE infraestructura educativa con acciones de rehabilitación, construcción y equipamiento en...
- 📅 23 de Ago de 2021 | 📱 f 📱
Mejora ISIE infraestructura educativa en el sur de Sonora con 306 obras...
- 📅 17 de Ago de 2021 | 📱 f 📱
Con la rehabilitación y equipamiento de escuelas de la zona centro se...
- 📅 16 de Ago de 2021 | 📱 f 📱
Se beneficia norte de Sonora con inversión de 188 MDP en infraestructura...

Twitter @ISIEsonora

📱 ISIE retweetó

Gobierno del Estado de Sonora @gobiernosonora

La mejor manera de conmemorar el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, es la prevención, para una detección oportuna.

Institución

- Titular
- Quiénes Somos
- Misión / Visión
- Programa Institucional
- Objetivos
- Valores
- Ubicación
- Contacto

Contratistas

- Trámites
- Capacitación En Línea

Difusión

- Noticias
- Aperturas de Licitaciones Publicas Estatales
- Aperturas de Licitaciones Publicas Federales
- Fallos de Licitaciones Publicas Estatales
- Fallos de Licitaciones Publicas Federales

Transparencia Sonora

info mex INFOMEX
Conócenos, con gusto atenderemos tus solicitudes

PORTAL TRANSPARENCIA.SONORA

TRANSPARENCIA ISIE

Proporciona su folio y contraseña indicado en el recibo

http://isie.sonora.gob.mx/contratistas/tramites. x

Tramites

Teléfono: (662) 214 60 33 Correo Electrónico: contacto@isie.gob.mx

Gobierno del Estado de Sonora Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Inicio Institución Informes y Programas **Contratistas** Difusión Contacto

Consulta de Trámites

Lo más reciente

© Vie, 23 de 09 de 2016 | f t
ISIE Participa en Honores a la Bandera

© Mar, 20 de 09 de 2016 | f t
Celebra ISIE Convenio con la Unidad Estatal de Protección Civil

© Sáb, 20 de 08 de 2016 | f t
Regreso a Clases 2016-2017

© Jue, 16 de 06 de 2016 | f t
Inicia Gobernadora Claudia Pavlovich programa "Rescatando Tu escuela"

Folio: Contraseña:

ISIE track

Consulta el historial de avance del trámite en las oficinas del ISIE

http://isie.sonora.gob.mx/contratistas/tramites.html

Teléfono: (662) 214 60 33 | Correo Electrónico: contacto@isie.gob.mx

Gobierno del Estado de Sonora | Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Inicio | Institución | Informes y Programas | **Contratistas** | Difusión | Contacto

Consulta de Trámites

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa | INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

HISTORIAL DE TRAMITE

Folio: **23296** | Contrato: **ISIE-FP100-16-041**
Tramite: **ESTIMACION** | No: **2**
Contratista: **PIECO PROYECTOS DE INTERMEDIACION ECONOMICOS,S.A. DE C.V.**
Entrego: **FATIMA** | Recibio: **PILAR**

Fecha de Recepción: **04/08/2016** a las **12:09 PM** | Fecha de Terminación:

Su tramite se encuentra en el paso **10** de **15**

Fecha	Hora	Area	Responsable	Para	Usuario	Observaciones
04/08/2016	12:12 PM	DIR. DE OBRAS. RECEPCION	ING. FELICIANO MARTINEZ	RECIBIR ESTIMACION	PILAR	
04/08/2016	1:30 PM	DIR. TECNICA. ESTIMATICO	ARQ. CRISTINA NAVARRO	GENERAR DOCUMENTACION	KARLA	
04/08/2016	2:25 PM	DIR. DE OBRAS. SUPERVISION	ING. FELICIANO MARTINEZ	REVISION	MYRNA RAMOS	
04/08/2016	3:11 PM	DIR. DE OBRAS. DIRECCION	ING. FELICIANO MARTINEZ	REVISION Y FIRMA	BETY	
05/08/2016	2:03 PM	DIR. TECNICA. ESTIMATICO	ARQ. CRISTINA NAVARRO	REGISTRO EN EL SISTEMA	KARLA	
08/08/2016	12:35 PM	DIR. TECNICA. DIRECCION	ARQ. CRISTINA NAVARRO	REVISION	RAQUEL	
08/08/2016	2:59 PM	DIR. FINANZAS. DIRECCION	C.P. ALEJANDRO TORRES	TRAMITE PRESUPUESTAL	PATY SALDATE	
10/08/2016	10:21 AM	COORDINACION EJECUTIVA	ARQ. YALIA SALIDO	REGISTRO DE POLIZA	LAURA	
10/08/2016	3:41 PM	DIR. FINANZAS. CONTABILIDAD	C.P. ALEJANDRO TORRES	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA	CRISTINA	

Lo más reciente

Vié, 23 de 09 de 2016 | [f](#) [t](#)
ISIE Participa en Honores a la Bandera

Mar, 20 de 09 de 2016 | [f](#) [t](#)
Celebra ISIE Convenio con la Unidad Estatal de Protección Civil

Sáb, 20 de 08 de 2016 | [f](#) [t](#)
Regreso a Clases 2016-2017

Jue, 16 de 06 de 2016 | [f](#) [t](#)
Inicia Gobernadora Claudia Pavlovich programa "Rescatando Tu escuela"

Contratistas ▾ Difusión Contacto

Tramites

Capacitación >

Circulares

Contratación

Ejecución de Obra

Contratación

Registro como contratista de ISIE

Para registrarse como contratista de obra se deberá hacer el siguiente trámite:

- Previo al registro en el padrón de contratista de obra del ISIE, se deberá registrar en el padrón de contratistas del Gobierno del Estado, en la Dirección General de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios de la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo ubicada en el Blvd. Hidalgo y Comonfort, Edificio SIDUR, Planta Baja.
- Sitio web de la dependencia: www.sidur.sonora.gob.mx
- Correo Electrónico de la dependencia: contacto@sidur.gob.mx
- Una vez registrado en el padrón de contratistas del Gobierno del Estado, se presentara en la Dirección General Técnica en donde entregara el Formato de Padrón de Contratista junto con la documentación requerida.
- Los Formatos del Padrón de Contratistas pueden ser descargados de las siguientes ligas:
 - [Personas Físicas.](#)
 - [Personas Morales.](#)
- Anexo a los formatos deberá traer la Cedula para el Registro Simplificado de Licitación de Obra Pública y Servicios que exige la Dirección General de Licitaciones y Contratos de la Secretaría de la Contraloría del Estado, ubicada en el Centro de Gobierno, edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Comonfort y Paseo Río Sonora. La cual recibirá la solicitudes y documentos los días lunes y martes de 8:00 a 15:00 horas.

Sitio web para registro simplificado de contraloria: <http://contraloria.sonora.gob.mx/empresario/registro-simplificado/cedula-para-el-registro-simplificado-de-licitantes-de-obra-publica-y-servicios.html>.

Correo Electrónico de Contraloria: contraloriasocial@sonora.gob.mx

Procedimiento de Contratación

Una vez registrado dentro del Padrón de Contratistas del ISIE podrá participar en los eventos de licitaciones que el ISIE realiza para la obtención de un contrato.

Los documentos que se requieren para la integración del Contrato con Recursos Estatal son los siguientes:

- Contrato Original Firmado (Formalizado por las partes).
- 2 copias de Carta de No Adeudo Estatal (24 BIS)([Guía](#)).
- 1 copia del Registro de la Contraloría (licitación Simplificada por invitación y/o Adjudicación Directa).
- Original y Copia de la factura a Nombre del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (DEBERA DE CONSIDERAR UN TEXTO ADICIONAL EN EL CUERPO DE LA FACTURACIÓN DONDE CONTEMPLA DATOS BANCARIOS PARA EFECTO DE AGILIZAR SU TRAMITE POR PARTE DE NUESTRA TESORERIA QUIENES LES HARA LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LOS ANTICIPOS ASI COMO DE LAS ESTIMACIONES).
- XML de la factura y una copia.
- Copia del Pago Documental.
 - A nombre del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.
 - No. De Cuenta: 65503684341
 - Clabe: 014760655036843417
 - Banco: Santander
- Programa de Obra de acuerdo a la fecha original del contrato ([Descargar Formato](#)).
- Fianza de anticipo (original y copia).
- Fianza de cumplimiento y vicios ocultos (original y dos copias).

Referente al costo del paquete documental de la obra, puede realizar el deposito a la cuenta del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

Nota: Se tienen 3 días hábiles a partir de la notificación para reunir la documentación que se le solicita y que deberá ser entregada en el Departamento de Contratos.

Los documentos que se requieren para la integración del Contrato con Recursos Federal son los siguientes:

- Contrato Original Firmado (Formalizado por las partes).
- 2 copias de Carta de No Adeudo Estatal (32D) ([Guía](#)).
- Original y Copia de la factura a Nombre del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa(DEBERA DE CONSIDERAR UN TEXTO ADICIONAL EN EL CUERPO DE LA FACTURACIÓN DONDE CONTEMPLA DATOS BANCARIOS PARA EFECTO DE AGILIZAR SU TRAMITE POR PARTE DE NUESTRA TESORERIA QUIENES LES HARA LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LOS ANTICIPOA ASI COMO DE LAS ESTIMACIONES).
- XML de la factura y una copia.
- Programa de Obra de acuerdo a la fecha original del contrato ([Descargar Formato](#)).
- Fianza de anticipo (original y copia).
- Fianza de cumplimiento (original y copia).

